



災害復旧事業の進捗状況

総頭川1号線（寺参橋）



天地川支川2（小屋浦4丁目：広島県施工）



明神川(三田尾：国土交通省施工)



町道総頭川1号線災害復旧工事に伴う交通規制を解除しました。
（令和4年7月31日現在）

坂地区では、町道総頭川1号線災害復旧工事に伴う交通規制を解除しました。長期にわたり、町民の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。尚、向井田橋から下流側の仮舗装区間については、広島市水道局の工事にて今後本舗装を実施していきます。

また、坂地区では国土交通省が施工する明神川、小屋浦地区では広島県が施工する天地川支川2の堰堤工事が完成しました。

今後も被災箇所の復旧・復興に全力をあげて取り組んでまいりますのでご理解とご協力をお願いします。

【小屋浦地区】

No.	道路・河川名	工事延長	完成予定時期
1	天地川2号線	L=16.1m	完了
2	西山1号線他3路線	L=281.8m	完了
3	スドコ線(極楽橋)	L=9.4m	完了
4-①	天地川1号線(本谷橋)(下部工)	L=12.7m	完了
4-②	天地川1号線(本谷橋)(上部工)	L=12.7m	完了
5-①	藤之脇7号線(天地橋)(下部工)	L=9.8m	完了
5-②	藤之脇7号線(天地橋)(上部工)	L=9.8m	完了
6	大判川(護岸)	L=126.5m	完了
7	天地川1号線(護岸・歩道)	L=644.0m	完了

【植田地区】

No.	道路・河川名	工事延長	完成予定時期
1	植田上条線	L=305.0m	完了
2	植田10号線	L=35.2m	完了
3	植田22号線	L=278.5m	完了
4	上条19号線(嶺橋)	L=8.2m	令和5年3月

【横浜西一丁目地区】

No.	道路・河川名	工事延長	完成予定時期
1	横浜6259地区(地がけ)	L=40m	完了

【横浜中央二丁目地区】

No.	道路・河川名	工事延長	完成予定時期
1	横浜5416地区(地がけ)	L=28m	完了

【横浜東二丁目地区】

No.	道路・河川名	工事延長	完成予定時期
1	植田側道線	L=38.7m	完了

【坂地区】

No.	道路・河川名	工事延長	完成予定時期
1	町道総頭川1号線、町道坂小屋浦線	L=68.3m	廃工(注)
2	森条火葬場線	L=8.7m	令和5年3月
3	総頭川2号線	L=8.4m	完了
4	総頭川1号線(中学橋)	L=6.1m	完了
5-①	総頭川1号線(荒神橋～向井田橋)	L=550.9m	令和4年8月
5-②	総頭川1号線(向井田橋～旗橋)	L=194.1m	完了
5-③	総頭川1号線(本総頭橋～荒神橋)	L=104.5m	完了
6-①	向井田線(横尾橋)(下部工)	L=8.2m	完了
6-②	向井田線(横尾橋)(上部工)	L=8.2m	完了
7-①	総頭川1号線(寺参橋)(下部工)	L=9.0m	完了
7-②	総頭川1号線(寺参橋)(上部工)	L=9.0m	令和4年8月

※前月からの変更部分

(太字表示は、工事発注済又は工事完了を示しています。)

(注)町道総頭川1号線、町道坂小屋浦線は国の砂防事業計画地内に含まれるため、廃工となりました。

【広島県による災害復旧工事箇所】

	対応主体	種別	施工業者	完成予定時期
天地川	広島県	砂防設備	(株)伏光組	令和3年6月
総頭川	"	"	広島ガステクノサービス(株)	令和3年12月
明神川	"	"	(株)横山建設	令和4年8月




ご迷惑をおかけしております

【水尻地区】

No.	道路・河川名	工事延長	完成予定時期
1	上水落川(護岸)	L=191.0m	完了
2	水尻川(護岸)	L=243.5m	完了
3	水尻1号線他2路線(護岸・歩道)	L=74.5m	完了
4	水尻1号線(水尻橋)	L=6.3m	完了

平成 30 年 7 月豪雨災害 砂防・治山整備計画図（緊急事業等）

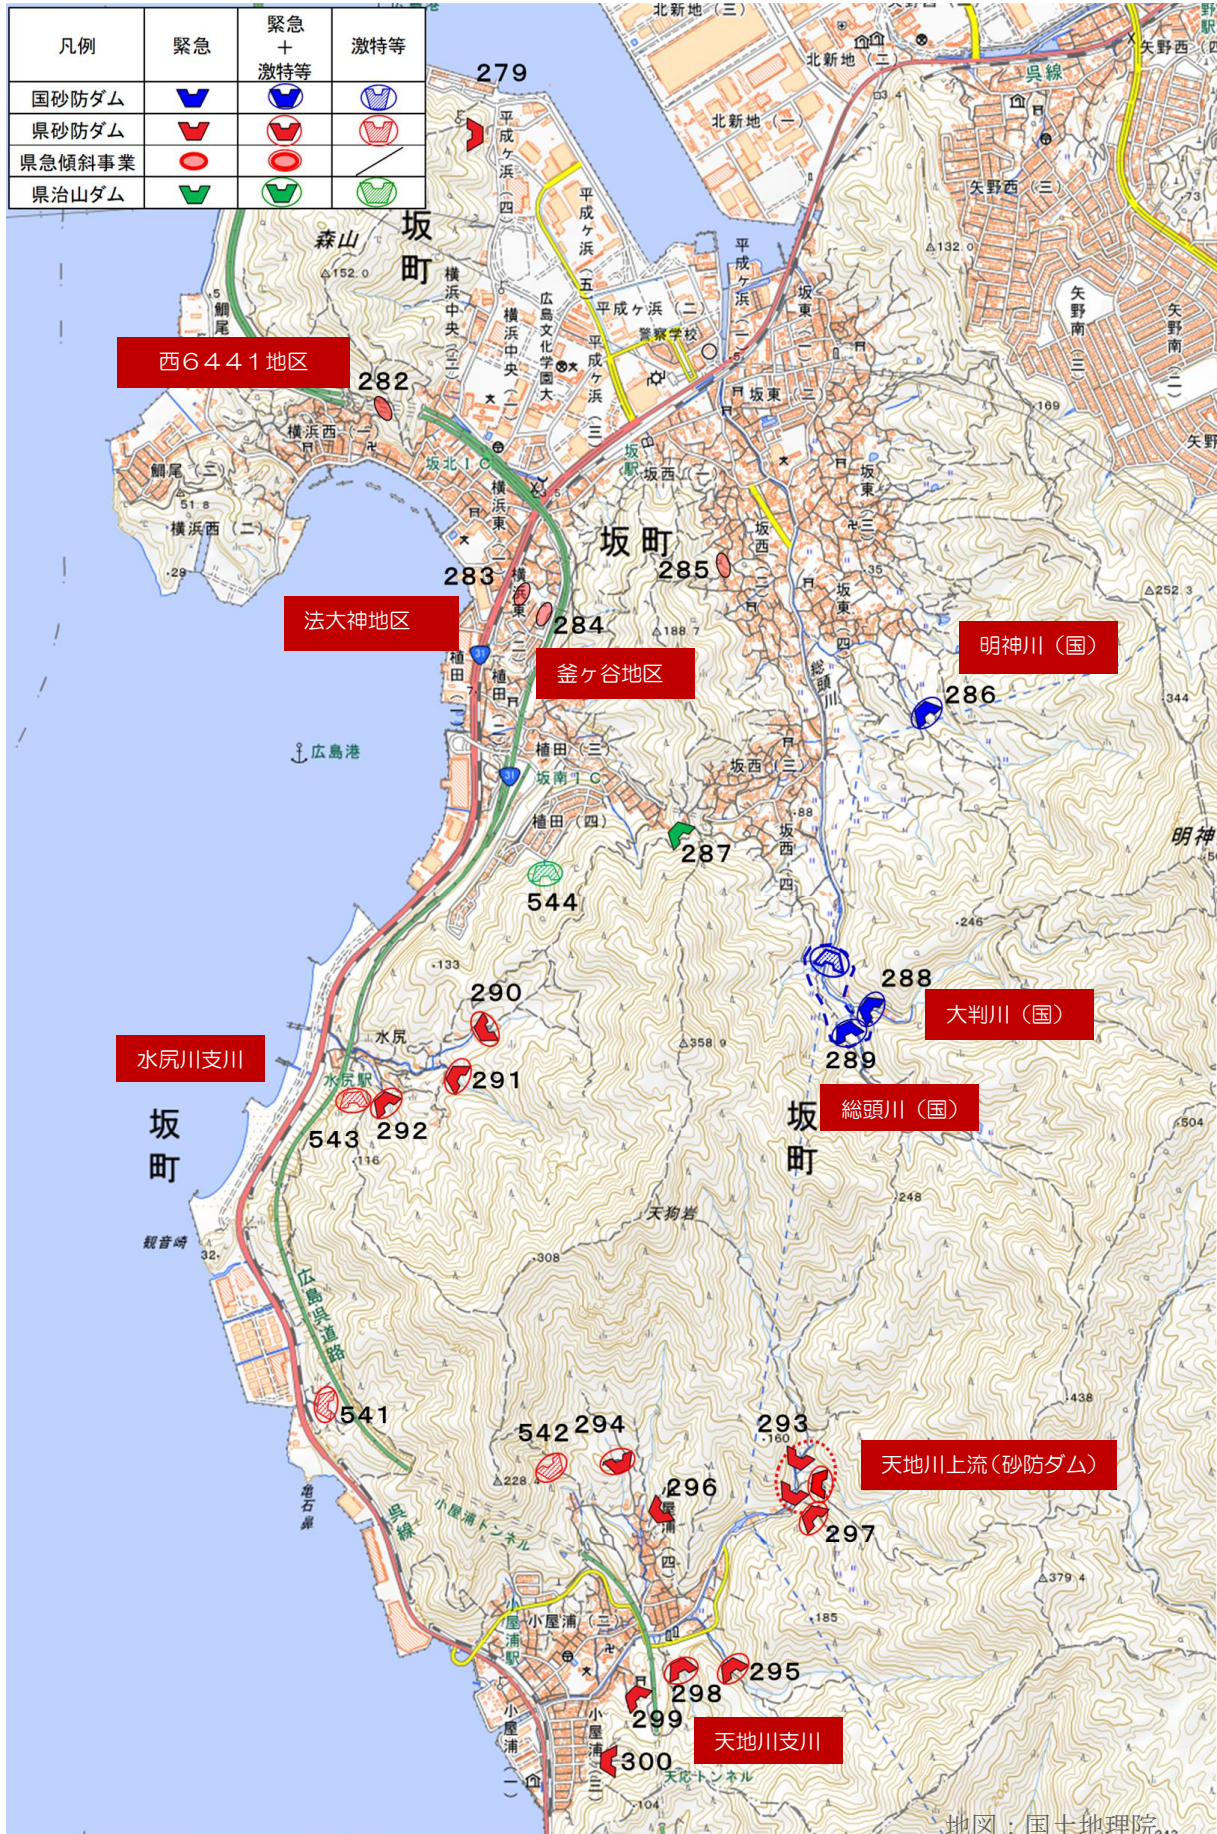

※坂町ホームページで、カラー版を公開しています。

天地川支川 8 (小屋浦四丁目：広島県施工)



H30災害関連緊急事業等進捗管理一覽表

亀石川（亀石山：広島県施工）



令和4年7月31日現在

整備計画箇所番号	災関	激特等	溪流名・箇所名	所在	対応主体	工事発注 (契約日)	施工業者	完成予定
279	○		横浜川12	横浜中央二丁目	県(砂防)	R2.2月25日	(株)三洋技建	令和3年6月完成
282	○		西6441地区	横浜西一丁目	県(急傾斜)	H31.4月12日	(株)洋翔	令和2年4月完成
283	○		法大神地区	横浜東二丁目	県(急傾斜)	H31.4月12日	(株)洋翔	令和元年10月完成
284	○		釜ヶ谷地区	横浜東二丁目	県(急傾斜)	H31.4月12日	(株)洋翔	令和2年5月完成
285	○		西側地区	坂西二丁目	県(急傾斜)	H31.3月22日	(株)東伸	令和元年12月完成
286	○		明神川	三田尾	国(砂防)	H31.2月14日	山陽工業(株)	令和2年3月完成
		○				R2.4月1日	山陽工業(株)	令和2年11月完成
		○				R2.11月10日	山陽工業(株)	令和2年12月完成
287	○		西嶽地区	西嶽	県(治山)	R2.3月17日	楳広建設(株)	令和3年3月完成
288	○		大判川	総頭山	国(砂防)	H31.2月21日	(株)鴻治組	令和2年3月完成
		○				R2.4月1日	(株)鴻治組	令和2年12月完成
		○				R3.1月27日	若松建設(株)	令和4年8月
289	○		総頭川	総頭山	国(砂防)	H31.2月21日	(株)鴻治組	令和2年3月完成
		○				R2.4月1日	(株)鴻治組	令和2年12月完成
		○				R3.1月27日	若松建設(株)	令和4年8月
						R4.4月25日	(株)鴻治組	令和5年12月
290	○		水尻川支川3	水尻	県(砂防)	R1.10月2日	広成建設(株)	令和2年10月完成
		○				R2.9月4日	河井建設工業(株)	令和4年6月完成
291	○		水尻川支川4	水尻	県(砂防)	R1.10月2日	広成建設(株)	令和2年10月完成
		○				R2.9月4日	河井建設工業(株)	令和4年3月完成
292	○		水落川	水尻	県(砂防)	R1.10月2日	広成建設(株)	令和2年10月完成
						R2.4月27日	河井建設工業(株)	令和3年8月完成
		○						令和3年10月完成
293	○		天地川(上流)	小屋浦四丁目	県(砂防)	R1.10月2日	(株)伏光組	令和元年12月完成
			天地川(下流)			R1.12月23日	(株)伏光組	令和2年11月完成
		○	天地川(Ⅰ-1)			R3.6月25日	大政建設工業(株)	令和4年10月
		○	天地川(Ⅲ-1)			R3.4月21日	大政建設工業(株)	令和5年12月
		○	天地川(堆積工)			R3.10月1日	(株)伏光組	令和5年3月
294	○		天地川支川1	小屋浦四丁目	県(砂防)	R1.11月6日	(株)鴻治組	令和3年2月完成
		○						令和5年度
		○				天地川支川1-2		令和5年度
		○				天地川支川1-5		令和5年度
295	○		天地川支川2	小屋浦四丁目	県(砂防)	R1.10月18日	大政建設工業(株)	令和3年3月完成
		○				R2.8月24日	大政建設工業(株)	令和4年6月完成
296	○		天地川支川5	小屋浦四丁目	県(砂防)	H31.4月12日	(株)鴻治組	令和2年2月完成
297	○		天地川支川6	小屋浦四丁目	県(砂防)	R1.10月18日	大政建設工業(株)	令和3年3月完成
		○				R1.10月18日	大政建設工業(株)	令和3年12月完成
298	○		天地川支川8	小屋浦四丁目	県(砂防)	R1.11月28日	(株)SUMIDA	令和3年3月完成
		○				R1.11月28日	(株)SUMIDA	令和4年10月
299	○		天地川支川9	小屋浦三丁目	県(砂防)	R2.7月13日	宮川興業(株)	令和3年3月完成
300	○		天地川支川10	小屋浦三丁目	県(砂防)	R1.10月11日	(株)SUMIDA	令和3年3月完成
541		○	亀石川2	亀石山	県(砂防)	R3.3月8日	河井建設工業(株)	※令和4年7月
542		○	天地川支川3	小屋浦四丁目	県(砂防)	R3.6月7日	(株)鴻治組	令和4年12月
543		○	水落川隣	水尻	県(砂防)			令和5年度
544		○	手切川	手切川	県(治山)			令和4年度

災害関連緊急砂防事業等の
取り組み状況



国土交通省、広島県が施工している溪流では砂防ダム本堤に引き続いて追加の砂防ダム、溪流保全工等の整備が進められています。

※前月からの変更部分を明示

国土交通省対応

完成
