

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年07月08日

計画の名称	坂町における快適で良好な環境の実現と総合的な浸水対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	坂町												
計画の目標	町民の快適で良好な環境の実現に資するため、汚水施設の改築更新を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	104	A	104	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	R2末
1	下水道管渠（坂処理区）にかかわる長寿命化計画策定の達成率を100%に増加させる。 汚水管渠長寿命化計画策定の達成率 策定済箇所（件） / 策定予定箇所（件）	0%	100%	100%
2	下水道管渠（坂処理区）における改築達成率を0%から100%に増加させる。 下水道管渠の改築達成率 改築済延長（km） / 改築予定延長（km）	0%	30%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---




事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
坂町都市計画課において実施	令和4年5月
	公表の方法
	町のHPに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標どおり、坂処理区の下水道管渠に関する長寿命化計画を策定できた。</li> <li>・坂処理区の下水道管渠の改築達成率は目標の100%には未到達であったが、概ね（89%）整備することができた。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
坂町下水道ストックマネジメント計画に基づき、計画的な点検・調査及び長寿命化を含めた改築等を実施する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	策定済箇所（件） / 策定予定箇所（件）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	改築済延長（km） / 改築予定延長（km）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	89%

(参考図面) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)

計画の名称	1 坂町における快適で良好な環境の実現と総合的な浸水対策の推進 (防災・安全)	交付対象	坂町
計画の期間	平成28年度 ~ 令和2年度 (5年間)		

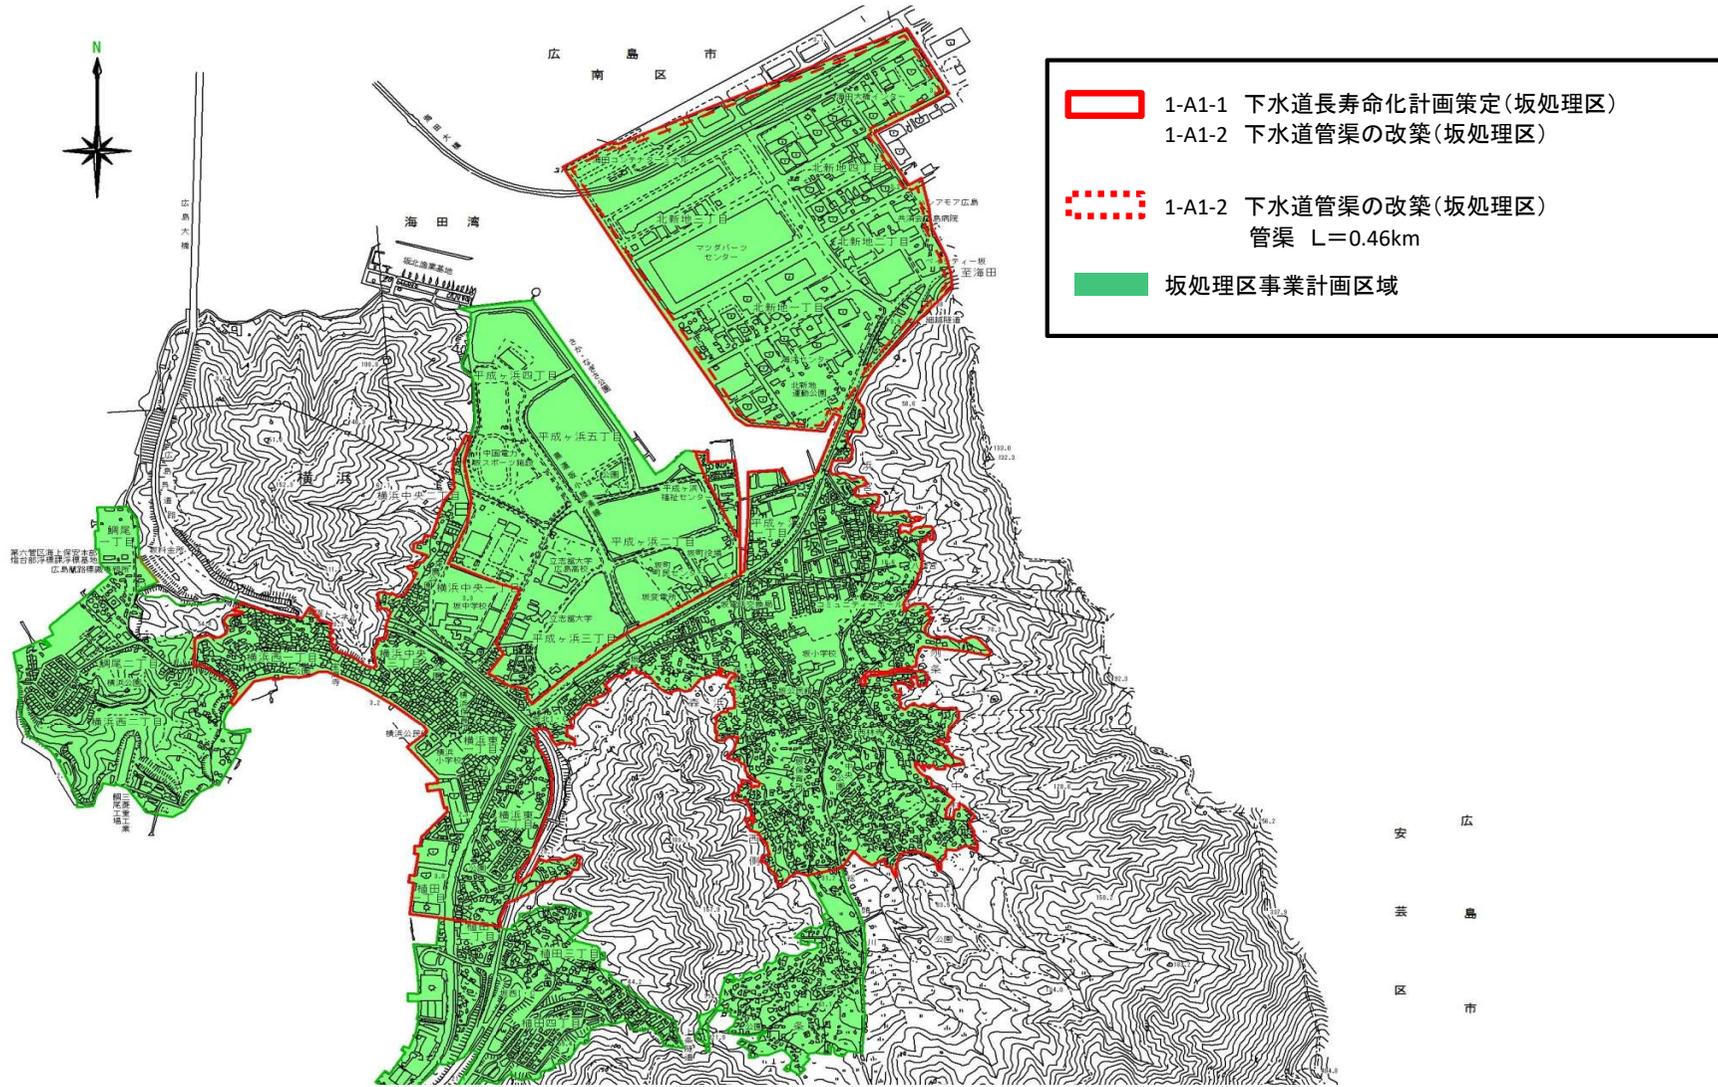

計画の名称	1 坂町における快適で良好な環境の実現と総合的な浸水対策の推進 (防災・安全)	交付対象	坂町
計画の期間	平成28年度 ~ 令和2年度 (5年間)		

