



災害復旧事業の進捗状況

水尻川支川3(水尻：広島県施工)



天地川支川3(小屋浦四丁目：広島県施工)



天地川支川8(小屋浦四丁目：広島県施工)



天地川I-1(小屋浦四丁目：広島県施工)



明神川(三田尾：広島県施工)



亀石川(亀石山：広島県施工)



現在、町内の各地区で復旧・復興工事を進めています。
国土交通省が施工する総頭川では、遊砂地整備のための工事が進められています。
また、これから台風シーズンに入ります。
マイ・タイムラインを作成し、災害時にとるべき行動をあらかじめ決めておきましょう。

総頭川では遊砂地整備のための工事が進められています。

(令和4年8月31日現在)

【小屋浦地区】

No.	道路・河川名	工事延長	完成予定時期
1	天地川2号線	L=16.1m	完了
2	西山1号線他3路線	L=281.8m	完了
3	スドコ線(極楽橋)	L=9.4m	完了
4-①	天地川1号線(本谷橋)(下部工)	L=12.7m	完了
4-②	天地川1号線(本谷橋)(上部工)	L=12.7m	完了
5-①	藤之脇7号線(天地橋)(下部工)	L=9.8m	完了
5-②	藤之脇7号線(天地橋)(上部工)	L=9.8m	完了
6	大判川(護岸)	L=126.5m	完了
7	天地川1号線(護岸・歩道)	L=644.0m	完了

【植田地区】

No.	道路・河川名	工事延長	完成予定時期
1	植田上条線	L=305.0m	完了
2	植田10号線	L=35.2m	完了
3	植田22号線	L=278.5m	完了
4	上条19号線(嶺橋)	L=8.2m	令和5年3月

【横浜西一丁目地区】

No.	道路・河川名	工事延長	完成予定時期
1	横浜6259地区(地がけ)	L=40m	完了

【横浜中央二丁目地区】

No.	道路・河川名	工事延長	完成予定時期
1	横浜5416地区(地がけ)	L=28m	完了

【横浜東二丁目地区】

No.	道路・河川名	工事延長	完成予定時期
1	植田側道線	L=38.7m	完了

【坂地区】

No.	道路・河川名	工事延長	完成予定時期
1	町道総頭川1号線・町道坂小屋浦線	L=68.3m	廃工(注)
2	森条火葬場線	L=8.7m	令和5年3月
3	総頭川2号線	L=8.4m	完了
4	総頭川1号線(中学橋)	L=6.1m	完了
5-①	総頭川1号線(荒神橋～向井田橋)	L=550.9m	令和4年8月
5-②	総頭川1号線(向井田橋～旗橋)	L=194.1m	完了
5-③	総頭川1号線(本総頭橋～荒神橋)	L=104.5m	完了
6-①	向井田線(横尾橋)(下部工)	L=8.2m	完了
6-②	向井田線(横尾橋)(上部工)	L=8.2m	完了
7-①	総頭川1号線(寺参橋)(下部工)	L=9.0m	完了
7-②	総頭川1号線(寺参橋)(上部工)	L=9.0m	令和4年8月

※前月からの変更部分

(太字表示は、工事発注済又は工事完了を示しています。)

(注)町道総頭川1号線、町道坂小屋浦線は国の砂防事業計画地内に含まれるため、廃工となりました。


【広島県による災害復旧工事箇所】

	対応主体	種別	施工業者	完成予定時期
天地川	広島県	砂防設備	(株)伏光組	令和3年6月
総頭川	〃	〃	広島ガステクノサービス(株)	※令和4年8月
明神川	〃	〃	(株)横山建設	令和4年8月



ご迷惑をおかけしております

平成 30 年 7 月豪雨災害 砂防・治山整備計画図（緊急事業等）

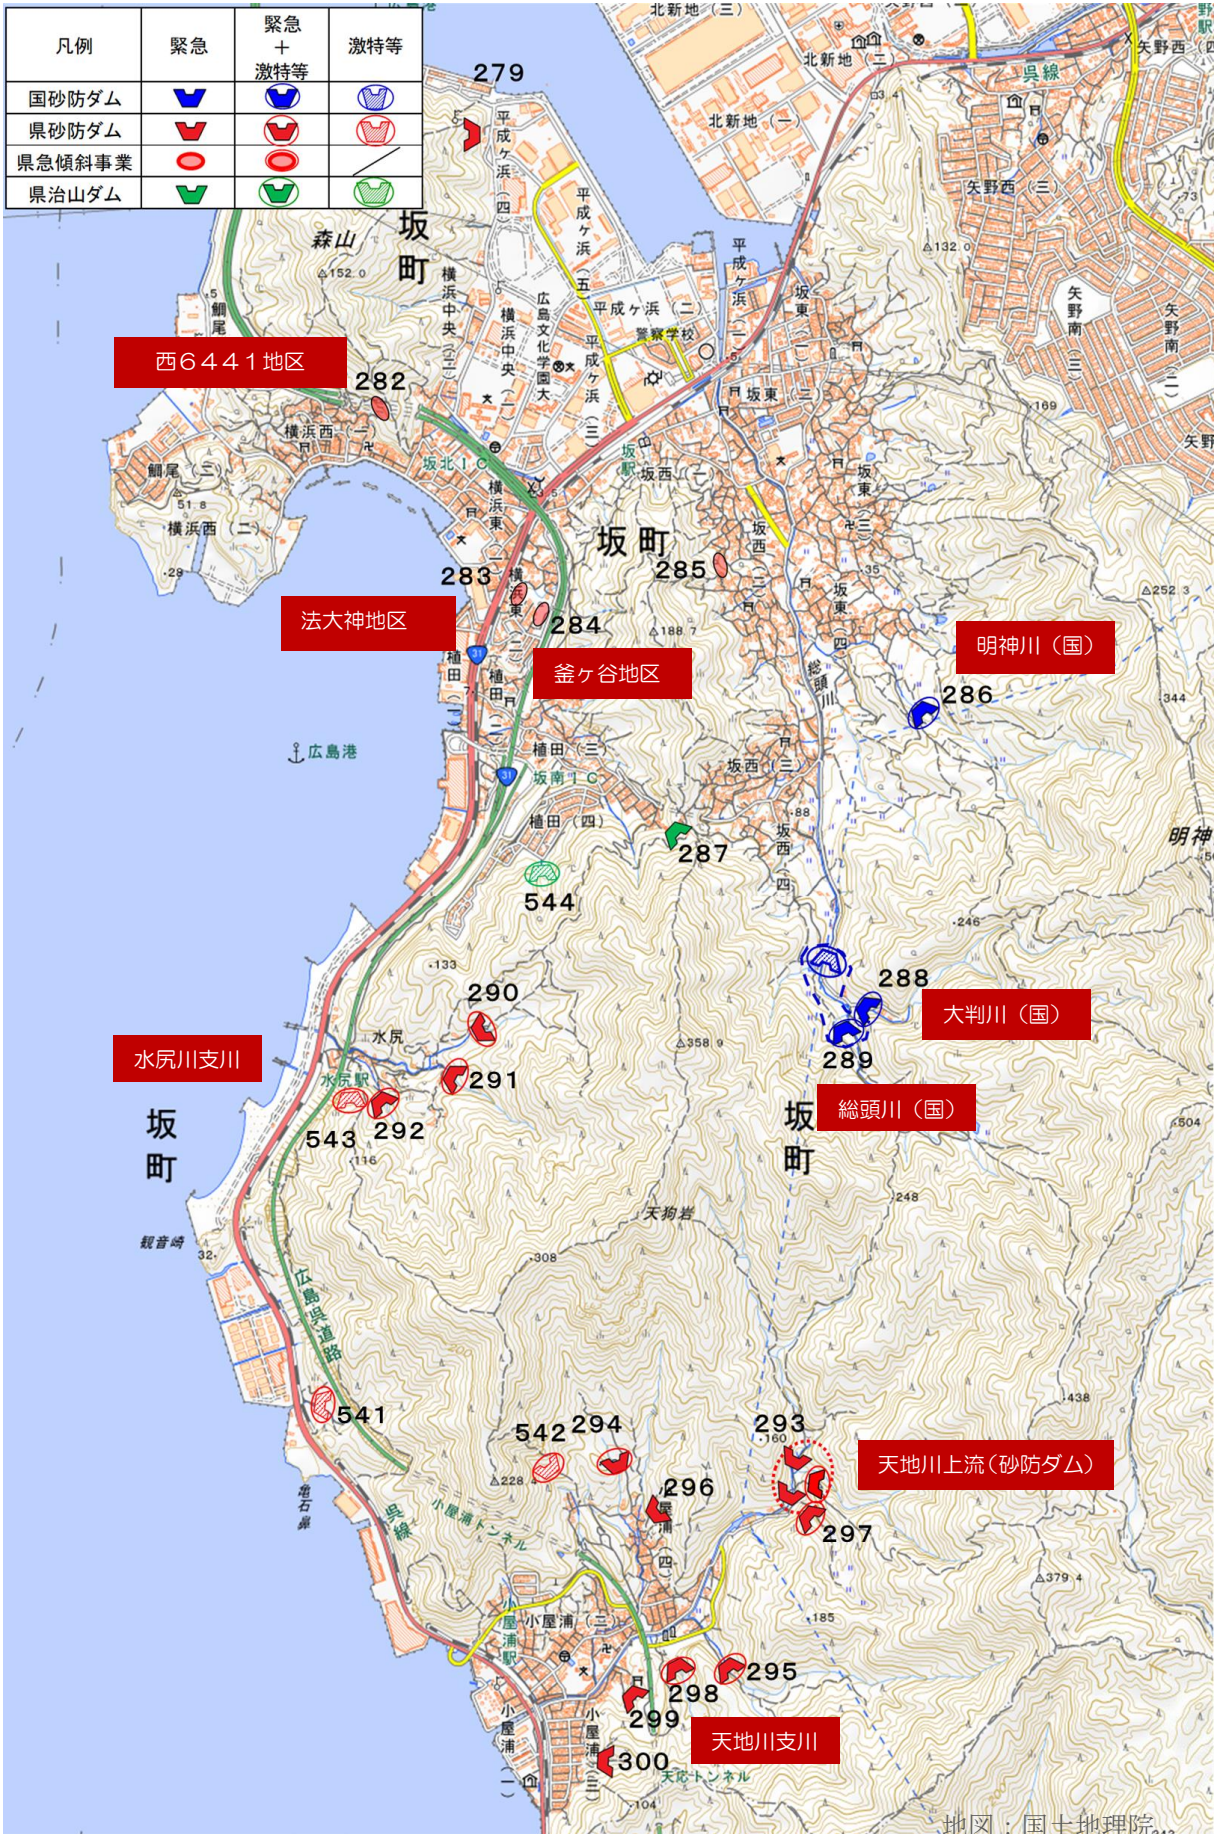


※坂町ホームページで、カラー版を公開しています。

総頭川（総頭山：国土交通省施工）



大判川（総頭山：国土交通省施工）

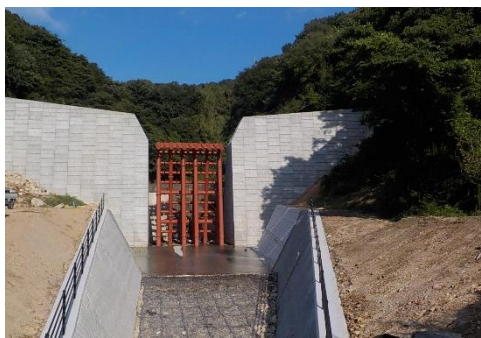

H30災害関連緊急事業等進捗管理一覧表

令和4年8月31日現在

整備計画箇所番号	災関	激特等	渓流名・箇所名	所在	対応主体	工事発注(契約日)	施工業者	完成予定
279	○		横浜川12	横浜中央二丁目	県(砂防)	R2.2月25日	(株)三洋技建	令和3年6月完成
282	○		西6441地区	横浜西一丁目	県(急傾斜)	H31.4月12日	(株)洋翔	令和2年4月完成
283	○		法大神地区	横浜東二丁目	県(急傾斜)	H31.4月12日	(株)洋翔	令和元年10月完成
284	○		釜ヶ谷地区	横浜東二丁目	県(急傾斜)	H31.4月12日	(株)洋翔	令和2年5月完成
285	○		西側地区	坂西二丁目	県(急傾斜)	H31.3月22日	(株)東伸	令和元年12月完成
286	○	○	明神川	三田尾	国(砂防)	H31.2月14日	山陽工業(株)	令和2年3月完成
						R2.4月1日	山陽工業(株)	令和2年11月完成
						R2.11月10日	山陽工業(株)	令和4年6月完成
287	○		西嶽地区	西嶽	県(治山)	R2.3月17日	梶広建設(株)	令和3年3月完成
288	○	○	大判川	総頭山	国(砂防)	H31.2月21日	(株)鴻治組	令和2年3月完成
						R2.4月1日	(株)鴻治組	令和2年12月完成
						R3.1月27日	若松建設(株)	※令和4年8月完成
289	○	○	総頭川	総頭山	国(砂防)	H31.2月21日	(株)鴻治組	令和2年3月完成
						R2.4月1日	(株)鴻治組	令和2年12月完成
						R3.1月27日	若松建設(株)	※令和4年8月完成
						R4.4月25日	(株)鴻治組	令和5年12月
								※令和5年
290	○	○	水尻川支川3	水尻	県(砂防)	R1.10月2日	広成建設(株)	令和2年10月完成
						R2.9月4日	河井建設工業(株)	※令和5年3月
291	○	○	水尻川支川4	水尻	県(砂防)	R1.10月2日	広成建設(株)	令和2年10月完成
						R2.9月4日	河井建設工業(株)	令和4年3月完成
						R2.9月4日	河井建設工業(株)	※令和5年3月
292	○	○	水落川	水尻	県(砂防)	R1.10月2日	広成建設(株)	令和2年10月完成
						R2.4月27日	河井建設工業(株)	令和3年8月完成 令和3年10月完成
293	○	○	天地川(上流)	小屋浦四丁目	県(砂防)	R1.10月2日	(株)伏光組	令和元年12月完成
			天地川(下流)			R1.12月23日	(株)伏光組	令和2年11月完成
			天地川(Ⅰ-1)			R3.6月25日	大政建設工業(株)	令和4年10月
			天地川(Ⅲ-1)			R3.4月21日	大政建設工業(株)	令和5年12月
			天地川(堆積工)			R3.10月1日	(株)伏光組	令和5年3月
294	○	○	天地川支川1	小屋浦四丁目	県(砂防)	R1.11月6日	(株)鴻治組	令和3年2月完成
			天地川支川1-2					令和5年度
			天地川支川1-5					令和5年度
								令和5年度
295	○	○	天地川支川2	小屋浦四丁目	県(砂防)	R1.10月18日	大政建設工業(株)	令和3年3月完成
296	○	○	天地川支川5	小屋浦四丁目	県(砂防)	R2.8月24日	大政建設工業(株)	令和4年6月完成
297	○	○	天地川支川6	小屋浦四丁目	県(砂防)	H31.4月12日	(株)鴻治組	令和2年2月完成
						R1.10月18日	大政建設工業(株)	令和3年3月完成
298	○	○	天地川支川8	小屋浦四丁目	県(砂防)	R1.10月18日	大政建設工業(株)	令和3年12月完成
						R1.11月28日	(株)SUMIDA	令和3年3月完成
299	○	○	天地川支川9	小屋浦三丁目	県(砂防)	R1.11月28日	(株)SUMIDA	令和4年10月
300	○	○	天地川支川10	小屋浦三丁目	県(砂防)	R2.7月13日	宮川興業(株)	令和3年3月完成
541		○	亀石川12	亀石山	県(砂防)	R1.10月11日	(株)SUMIDA	令和3年3月完成
542		○	天地川支川3	小屋浦四丁目	県(砂防)	R3.3月8日	河井建設工業(株)	※令和5年3月
543		○	水落川隣	水尻	県(砂防)	R3.6月7日	(株)鴻治組	※令和5年2月
544		○	手切川	手切川	県(治山)			令和5年度

※前月からの変更部分を明示

国土交通省対応

完成

災害関連緊急砂防事業等の
取り組み状況



国土交通省、広島県が施工している溪流では砂防ダム本堤に引き続いて追加の砂防ダム、溪流保全工等の整備が進められています。
