



坂町が施工する町道の改良工事を発注しました（令和6年9月）

坂町施工の西側2号線道路改良工事、横浜一部15号線道路改良工事、浜田中洲線道路改良工事を発注し、10月には横浜三部16号線道路災害復旧工事を発注予定です。

また、坂町施工の坂東環状線道路改良（その2）工事も引き続き、整備を推進しています。

地域の皆様に、一日も早く完成した道路等公共施設を利用していただけるよう、鋭意、工事を進めてまいります。今後とも事業に対するご理解とご協力をお願いします。

坂町施工



▲西側2号線道路改良工事

西側公園入口付近から西側9号線との交差点までの狭隘な道路の拡幅工事をを行います。



▲横浜一部15号線道路改良工事

横浜西一丁目地内の狭隘な道路の拡幅工事をを行います。



▲浜田中洲線道路改良工事


車両同士の離合や歩行者等の安全を確保するため、道路拡幅工事をを行います。



▲横浜三部16号線道路災害復旧工事

7月1日豪雨により法面が崩壊し、現在町道が通行止めとなっていますが、道路開通を行うための法面对策工事をを行います。

▼坂東環状線道路改良（その2）工事

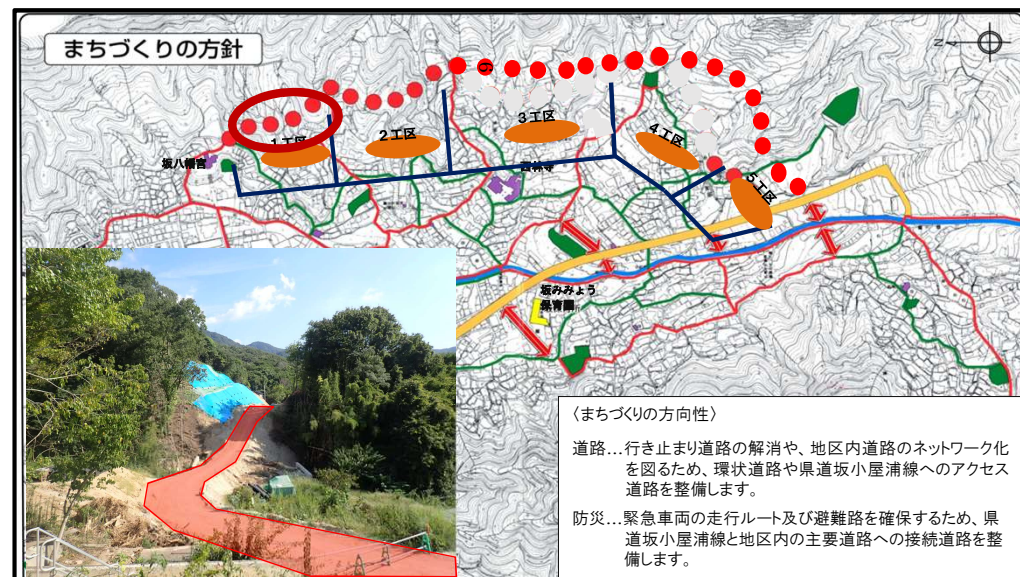

広島県施工(参考)



▲横浜6244地区急傾斜地崩壊対策工事

広島県施工により、横浜西一丁目地内の法面对策工事をを行います。

（工事期間：令和6年8月22日～令和7年8月29日）

令和6年度工事

事業者	工事名	工事延長	完成予定時期
町	坂東環状線道路改良（その2）工事	170.0m	令和6年12月
町	西側2号線道路改良工事	71.5m	令和7年3月
町	横浜一部15号線道路改良工事	75.0m	令和7年3月
町	横浜三部16号線道路災害復旧工事	15.7m	令和7年3月
町	浜田中洲線道路改良工事	120.0m	令和7年3月
町	横浜排水区雨水排水路改良（その2）工事	58.5m	令和7年1月
町	浜宮ポンプ場長寿化工事	1基	令和7年3月
県	横浜6244地区急傾斜地崩壊対策事業	30.0m	令和7年8月

（注）現在、執行中の箇所を記載しています。



問合せ先：坂町役場建設課
電話：082-820-1512
FAX：082-820-1523
E-mail：sanken@town.saka.lg.jp



平成30年7月豪雨災害 砂防・治山整備計画図（緊急事業等）


総頭川上流



水尻川支川



天地川上流支川

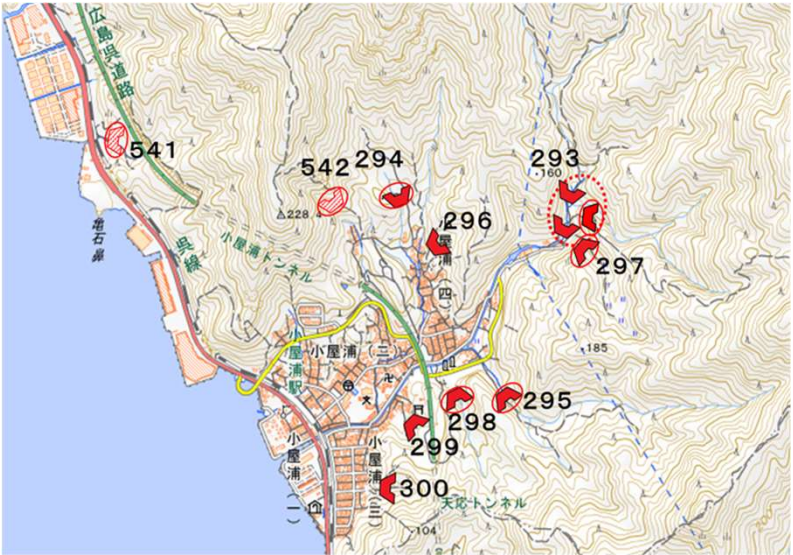

災害関連緊急砂防事業等の
取り組み状況

凡例	緊急	緊急 + 激特等	激特等
国砂防ダム			
県砂防ダム			
県急傾斜事業			
県治山ダム			



※坂町ホームページで、カラー版を公開しています。

地図：国土地理院



H30災害関連緊急事業等進捗管理一覧表

令和6年9月30日現在

整備計画箇所番号	災関	激特等	渓流名・箇所名	所在	対応主体	工事発注 (契約日)	施工業者	完成予定	備考
289	○	○	総頭川	総頭山	国(砂防)	H31.2.21日	(株)鴻治組	令和2年3月完成	砂防堰堤
						R2.4.1日	(株)鴻治組	令和2年12月完成	堰堤嵩上他
						R3.1.27日	若松建設(株)	令和4年8月完成	堰堤嵩上他
						R4.4.25日	(株)鴻治組	令和6年11月	堰堤工
						R4.10.13日	(株)鴻治組	令和6年10月	遊砂地
						R6.9.20日	(株)鴻治組	令和7年5月	遊砂地
290	○	○	水尻川支川3	水尻	県(砂防)	R1.10.2日	広成建設(株)	令和2年10月完成	国道嵩上、工事用道路
						R2.9.4日	河井建設工業(株)	令和4年6月完成	堰堤災関高
						R2.9.4日	河井建設工業(株)	令和4年8月完成	堰堤嵩上
						R5.3.22日	河井建設工業(株)	令和7年1月	前庭保護工、管理用道路工
291	○	○	水尻川支川4	水尻	県(砂防)	R1.10.2日	広成建設(株)	令和2年10月完成	国道嵩上、工事用道路
						R2.9.4日	河井建設工業(株)	令和4年3月完成	堰堤災関高
						R2.9.4日	河井建設工業(株)	令和5年2月完成	堰堤嵩上
						R5.3.22日	河井建設工業(株)	令和7年1月	前庭保護工、管理用道路工
292	○	○	水落川	水尻	県(砂防)	R1.10.2日	広成建設(株)	令和2年10月完成	国道嵩上、工事用道路
						R2.4.27日	河井建設工業(株)	令和3年8月完成	堰堤災関高
								令和3年10月完成	堰堤嵩上
						R5.3.22日	河井建設工業(株)	令和7年1月	前庭保護工、管理用道路工
293	○	○	天地川(上流)	小屋浦四丁目	県(砂防)	R1.10.2日	(株)伏光組	令和元年12月完成	砂防堰堤
			天地川(下流)			R1.12.23日	(株)伏光組	令和2年11月完成	砂防堰堤
			天地川(I-1)			R3.6.25日	大政建設工業(株)	令和4年12月完成	砂防堰堤
			天地川(Ⅲ-1)			R4.4.21日	大政建設工業(株)	令和6年3月完成	砂防堰堤
			天地川(堆積工)			R3.10.1日	(株)伏光組	令和5年5月完成	堆積工
			天地川(管理用道路)			R5.6.26日	(株)伏光組	令和7年3月	管理用道路
294	○	○	天地川支川1	小屋浦四丁目	県(砂防)	R1.11.6日	(株)鴻治組	令和3年2月完成	本堤工事
						R7発注予定		令和8年度	渓流保全工
			天地川支川1-2			R4.11.25日	(株)鴻治組	令和6年3月完成	・渓流保全工 ・管理用道路
			天地川支川1-5			R4.11.25日	(株)鴻治組	令和6年3月完成	・管理用道路
543		○	水落川隣	水尻	県(砂防)	R5.3.15日	アイフ産業(株)	令和6年5月完成	山腹工
544		○	手切川	手切川	県(治山)	R4.12.19日	(株)横山建設	令和6年2月完成	治山堰堤

水尻川支川3(水尻地区：広島県施工)



水尻川支川4(水尻地区：広島県施工)



総頭川（総頭山：国土交通省施工）



国土交通省、広島県が施工している渓流では砂防ダム本堤に引き続いて追加の砂防ダム、渓流保全工等の整備が進められています。
